




INFORME MESA PÚBLICO PRIVADA MEMORIA DOM EN LÍNEA

2do sem 2022



Contenido

<u>Introducción</u>	3
<u>Abreviaciones</u>	4
<u>Marco Legal –Ley 21.395</u>	5
<u>Gobernanza – actores estratégicos</u>	6
<u>Continuidad Equipo DOM en Línea</u>	7
<u>Digitalización Catastros DOM</u>	8
<u>Módulo de Ingresos – avance de implementación</u>	9
<u>Módulo de Ingresos – gestión líneas de trabajo</u>	10
<u>Avance desarrollos futuros</u>	11
<u>Comunicación – web DOM en Línea</u>	12
<u>Eventos de difusión</u>	13



Informe – 2do sem 2022

Código QR te dirige a
domenlinea.minvu.cl

Introducción

El presente Informe DOM en Línea 2do sem 2022, se propone como complemento del anterior documento “Informe Mesa Público Privada – Memoria DOM en Línea 2021 - 1er sem 2022”. Por lo tanto, se desarrolla como un texto en continuidad que, en base a la estructura de contenido original expone, oportunidades para impulsar el proyecto con sus nuevos microservicios dentro del marco legal vigente, destaca la colaboración de actores de la Mesa Público Privada para difundirlo, grafica los avances alcanzados en el proceso de implementación de la plataforma considerando el levantamiento de indicadores de gestión que orientan su curso, actualiza el estado de avance de los desarrollos futuros que robustecen el ecosistema digital y explora el contacto con nuevos actores que se vinculan con su propósito, abriendo posibilidades que contribuyan al fortalecimiento de la iniciativa.

Cabe señalar que el valor de la experiencia de DOM en Línea, en cuanto proyecto de Estado, ha ido cobrando mayor relevancia al interior del MINVU incorporando, durante este periodo, mayores responsabilidades en la coordinación, vinculadas con todas las Direcciones de Obras como instancia directa de comunicación en virtud de la confianza construida, con la implementación de los Portales Ciudadanos asociados a la Ley de Transparencia del Mercado de Suelo y con el apoyo a las plataformas y tramitación de proyectos de diversas unidades de la DDU.

Este mayor espesor o densidad que ha ido adquiriendo el proyecto, ha movilizado una mayor capacidad de autogestión y especialización de los perfiles de sus integrantes, también ha atraído la colaboración de profesionales de otras unidades de la DDU en materia legal y comunicaciones, junto con el compromiso de las jefaturas de Departamento y División de impulsar y fortalecer DOM en Línea.

Sin embargo, no se puede desconocer el desbalance del Equipo DOM en Línea respecto del aumento de requerimientos sobre el proyecto, desde distintas perspectivas, por ejemplo en la mirada más amplia del contexto país, al acoger la invitación del Ministerio de Economía a exponer en la “Mesa Ejecutiva para la Productividad de la Construcción” y en el marco del proceso de Transformación Digital y Modernización del Estado, al acoger la invitación de la División de Gobierno Digital del Ministerio SEGPRES a formar parte de la “Mesa de Trabajo de Datos Geoespaciales y Direcciones”. También, en un futuro próximo, la estrategia de implementación de los nuevos módulos y plataformas de acceso ciudadanos orientados a usuarios solicitantes, municipalidades y SEREMI, que ampliarán progresivamente la cobertura del servicio, sin duda se traducirán en un desafío mayor que, probablemente, requerirá comprometer nuevos recursos y apoyo institucional orientados a consolidar DOM en Línea.

Abreviaciones

ADOM: Asociación de Directores de Obras Municipales	MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
AOA: Asociación de Oficinas de Arquitectos	MOP: Ministerio de Obras Públicas
ANRI: Asociación Nacional de Revisores Independientes	MPP: Mesa Público Privada
CBR: Conservador de Bienes Raíces	MTT: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
CCHC: Cámara Chilena de la Construcción A.G.	OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
COARQ: Colegio de Arquitectos de Chile A.G.	PIIMEP: Planes de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público
CORFO: Corporación de Fomento y la Producción	Planbim: Iniciativa de CORFO
DDU: División de Desarrollo Urbano (MINVU)	PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
DIJUR: División Jurídica (MINVU)	PUCV: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
DINFO: División de Informática (MINVU)	SEGPRES: Secretaría General de la Presidencia
DIPRES: Dirección de Presupuestos	SEM: Plataforma electrónica de SUBDERE
DITEC: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (MINVU)	SEIM: Sistema de Evaluación de Impacto a la Movilidad (Plataforma tecnológica del MTT)
DOM: Dirección, Director/a de Obras Municipales	SIAD: Sistema de Aprendizaje a Distancia, Academia SUBDERE
DPNU: Departamento de Planificación y Normas Urbanas	SI: Santiago Innova
FEAE: Firma Electrónica Avanzada del Estado	SII: Servicio de Impuestos Internos
FIE: Fondo de Inversión Estratégica	SIG: Sistemas de Información Geográfica
GAM: Centro Gabriela Mistral	SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
IC: Instituto de la Construcción	TGR: Tesorería General de la República
IMIV: Informe de Mitigación de Impacto Vial	UTEM: Universidad Tecnológica Metropolitana
INE: Instituto Nacional de Estadísticas	
IPT: Instrumentos de Planificación Territorial	
LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcciones	

Marco Legal – Ley 21.395

Explorando las posibilidades que ofrece el marco legal vigente, con el propósito de entregar un apoyo a municipios piloto e impulsar la modernización de sus Direcciones de Obras mediante la elaboración de sus Catastros de Predios, favoreciendo la próxima operación del nuevo Módulo DOM en Línea, Solicitud de Trámites, que reemplazará progresivamente el actual Módulo de Ingresos, el MINVU ha decidido gestionar una transferencia directa de recursos amparada en los términos definidos en la Glosa 18, según se indica a continuación:

Glosa 18 de la Ley 21.395 de presupuestos del Sector Público para el año 2022:

Partida 18, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 107, Glosa 18 de la Ley Nº 21.395 de presupuestos del Sector Público para el año 2022, referida a las transferencias de capital a otras entidades públicas, señalando que dichos recursos se destinarán para solventar los gastos asociados al desarrollo, implementación y mantención de la Plataforma Digital de Tramitación ante las Direcciones de Obras Municipales, DOM en Línea, mandatado por la Ley Nº21.078, sobre Transparencia de Mercado de Suelo e Impuesto al Valor por Ampliación del Límite Urbano y otras acciones relacionadas a desarrollos tecnológicos de procedimientos señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para dar cumplimiento a la Ley Nº21.180, sobre Transformación Digital del Estado, sus reglamentos y el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Noticias

Columna de Opinión



Por Vicente Burgos
Avances de DOM en Línea

DOM en Línea es un proyecto de transformación digital liderado por el Minvu, que se concreta como una línea de apoyo del ministerio a la gestión de las Direcciones de Obra del país...

[Leer más](#)

Newsletter Construye 2025 Noviembre 2022

Gobernanza – Actores estratégicos

A fines de Julio del 2022, el Equipo DOM en Línea es invitado a exponer los Avances del proyecto en la Sesión de Directorio del Comité Ejecutivo de **Construye 2025**, “programa impulsado por CORFO que busca transformar al sector de la construcción desde la productividad y la sostenibilidad, para lograr un desarrollo nacional impactando en forma positiva en los ámbitos social, económico y medioambiental”, respondiendo en algún sentido al objetivo de tener un dialogo permanente con la iniciativa, como actor estratégico de la Mesa Público Privada. El Consejo Directivo de Construye 2025 está actualmente presidido por Pablo Ivelic e integrado por CORFO, CChC, IC, MINVU (Ditec), MOP y PUCV.

En esta instancia, acogiendo los desafíos de este año del proyecto, respecto del avance en la interoperabilidad del sistema digital se destacó el crecimiento del Ecosistema DOM en Línea, que incorporará integraciones con organismos públicos mediante la colaboración interinstitucional en Mesas de Trabajo conjuntas con el MTT, INE, SII, y también con privados conforme a necesidades de mejora del servicio; los nuevos Módulos; Portales Ciudadanos y la App Móvil. En cuanto al objetivo de potenciar el uso de la plataforma y aumentar el índice de digitalización de trámites, el avance de implementación y reporte de uso indicaron un aumento progresivo en concordancia con la estrategia de seguimiento impulsada por el equipo.

De esta experiencia, surgió una oportunidad de colaboración en la difusión del proyecto, que se tradujo en una publicación de una columna, suscrita por Vicente Burgos Jefe DDU MINVU, en el Newsletter de Construye 2025 correspondiente al Informativo mensual de Noviembre, la cual detalló estos avances y que es posible visitar en este [enlace](#).

Por otra parte, durante Agosto del 2022, en el contexto de las Mesas Ejecutivas impulsadas por el Ministerio de Economía, desde la División de Fomento, Inversión e Industria, el Equipo DOM en Línea junto al Jefe de División, fue invitado a exponer al sector privado, el avance del proyecto en la “Mesa Ejecutiva para la Productividad de la Construcción”. En esta reunión virtual realizada el 10.08.2022 participaron representantes de instituciones de la MPP, MOP, Monumentos Nacionales, Corma, Déficit Cero y de empresas privadas como Arauco, Polpaico, Volcán, Ingevec, entre otros.

Junto con los contenidos expuestos en la convocatoria de Construye 2025, se amplió la mirada a los mandatos ministeriales, presentando maquetas de los Portales Ciudadanos, la programación de compras y desarrollos 2022-2023 y una propuesta de Interoperabilidad, que se configura como un “Portal de Inteligencia Territorial del MINVU” en cuanto herramienta de gestión, que incluye a **DOM en Línea** en un rol de conducción, PIIMEP, Programas Territoriales, Emergencia Habitacional y Obras Urbanas. Por otra parte, respecto del proceso de implementación en curso de DOM en Línea, se presentó la priorización de comunas según estado de avance, herramientas de seguimiento y estrategias de gestión involucrada, entre otras materias.

Continuidad Equipo DOM en Línea

Concentrando la mirada en el 2do semestre del 2022 y de cara al 2023, el Equipo DOM en Línea en sus distintos roles, de coordinación, analista normativo, asesoría territorial, co-diseño del ecosistema digital, soporte, comunicación y difusión, etc. ha enfrentado los desafíos del año con buenos resultados, según se expone en las páginas del presente Informe Mesa Pública Privada 2do sem 2022, de esta manera “se concreta como una línea de apoyo del ministerio a la gestión de las Direcciones de Obras”, según palabras del Jefe DDU MINVU en la columna publicada por Construye 2025. Es así, como DOM en Línea se encuentra en un proceso de consolidación en la Institución al asumir, por ejemplo, la responsabilidad del Portal Único de Información del Art. 28 Undecies, la articulación de gestiones vinculadas con el Plan de Emergencia Habitacional y constituirse en el canal directo con las Direcciones de Obras vinculado con ADOM, Asociación Gremial con que se pretende ejecutar una nueva Encuesta Nacional DOM 2023.

En otro ámbito, con el propósito de mejora del servicio, ofrecer un acompañamiento cercano a sus usuarios y favorecer un flujo adecuado de sus solicitudes, se ha desarrollado un “Plan de seguimiento de incidentes de uso de la plataforma digital” e implementado una estrategia de orientación para su correcto funcionamiento. La recepción de incidentes, reportados generalmente desde las DOM y excepcionalmente desde los mismos solicitantes, es a través del nivel central. Posteriormente previa evaluación, según proceda, son derivados a la DINFO para revisión y ejecución de las mejoras correspondientes en cada caso.



“Control de Gestión DPNU” 7 de diciembre 2022””

Control de Gestión DPNU

A comienzos del mes de Septiembre del 2022, con un enfoque centrado en la productividad, se incorporó la herramienta de control de gestión del DPNU denominada “Plan mensual de capacitaciones a las DOM”, que tiene por objetivo realizar mediciones con la frecuencia que indica su nombre, de las capacitaciones realizadas según usuario destinatario, estableciendo un registro de indicadores que permitirán definir metas y compromisos e identificar posibles amenazas y oportunidades de mejora. Cabe señalar que este Plan, busca sistematizar el trabajo que se ha estado realizando con las DOM en esta materia en tres líneas de acción: Capacitaciones DOM en Línea de Inducción y demostración de la plataforma digital, Capacitaciones mediante el SIAD de Academia SUBDERE y Capacitaciones DPNU a todas las DOM del país permitiendo gestionar sus requerimientos en materia normativa.

Durante el mes de diciembre se solicitó incluir en la presentación del Control de Gestión DPNU, los indicadores de gestión de la plataforma DOM en Línea respecto de los objetivos que se indican, algunos de ellos con mayor detalle en [anexo](#):


- Continuidad de la Implementación
- Cumplimiento de metas institucionales
- Avance en la consolidación de la plataforma, cumplimiento presupuesto 2022.
- Adecuaciones Normativas
- Consolidación indicadores de uso de la plataforma (reporte general de uso, gestión de incidentes y gestión de usuarios)

Digitalización Catastros DOM

Como fue señalado en el Marco Legal – Ley 21.395, el objetivo a lograr con esta asignación de recursos que permite la Glosa 18, es fortalecer a las DOM mediante la ejecución del proyecto “actualización catastro de predios”, de modo de contribuir en la mejora del servicio que ofrecen, modernizando el modo en que se realizan trámites en esa unidad municipal, utilizando la herramienta “Administrador de Catastro de Predios” que alimentará a su vez, en su etapa de carga masiva, al módulo “DOM Solicitud de Trámites”, al momento de implementar ambos microservicios.

Para determinar la preselección de los municipios piloto, se elaboró una metodología que consideró en una primera etapa criterios de exclusión de comunas con las siguientes características: Convenio de Colaboración para la implementación de la plataforma DOM en Línea sin Resolución MINVU; pertenencia al 10% de las comunas con mayor ingreso municipal; Módulo de Ingresos sin uso; cuentan con Catastro en DOM en Línea y con SIG para catastro digital.

Regiones municipios seleccionados proyecto Glosa 18

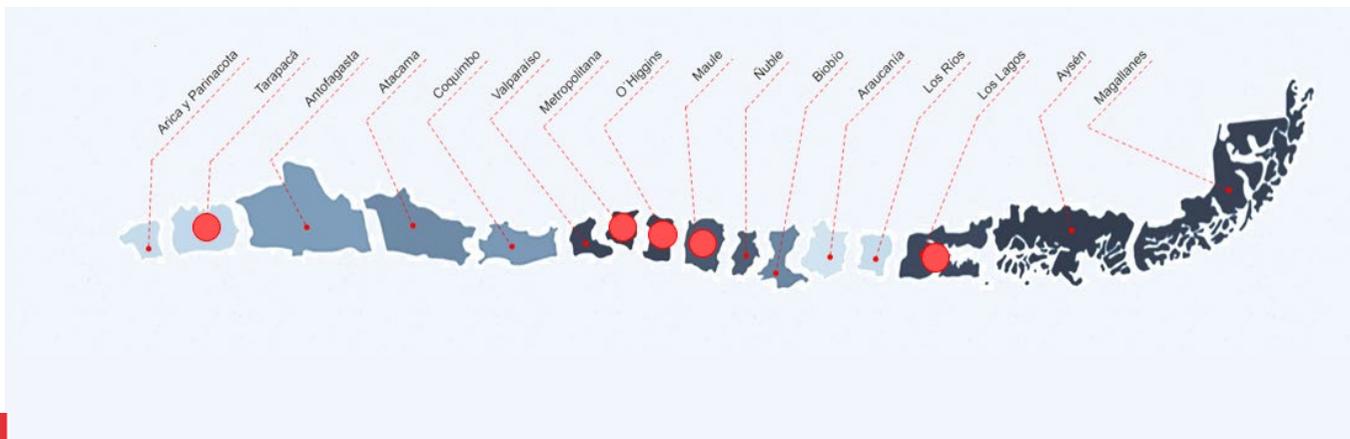


En una segunda etapa, se asignaron ponderaciones a criterios asociados a menor dotación profesional, menor infraestructura digital, mayor extensión territorial, mayor cantidad de predios, mayor porcentaje de ruralidad, mayor población beneficiada, menor ingreso municipal y mayor tramitación en DOM en Línea.

A su vez, consideró la elaboración de un “Convenio de Ejecución de Transferencia de recursos a Municipios” a suscribir entre el Ministro de Vivienda y Urbanismo y el Alcalde respectivo, en orden a la definición de plazos, monto, administración de fondos, procedimiento de rendición, obligaciones de las partes y asignación de contraparte técnica.


Se convocó a las comunas preseleccionadas con representantes de la Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Jurídico, etc. a quienes se les presentaron los contenidos del proyecto y su programación, comprometiendo como requisito inicial la firma del Alcalde del Convenio, contemplando un plazo ajustado. De esta manera, finalizado el proceso de tramitación de la Resolución MINVU de fecha 19.12.2022 aprobatoria, se cumplirá con la transferencia de recursos a las comunas seleccionadas: Pozo Almonte, San Miguel, Chimbarongo, Linares y Ancud.

Cabe señalar que, a pesar de ejecutar todo el presupuesto para el año 2022 desde DIPRES, no fueron asignados recursos a la Glosa DOM en Línea, asociada al Subtítulo 33, para el año 2023.

195 comunas en DOM en Línea
150 comunas en Módulo de Ingresos
+ 96 habilitadas al público
+ 54 en lanzamiento (por confirmar)
45 comunas en Módulo de Emergencia
11 en configuración
78 comunas sin plataforma (objetivo)

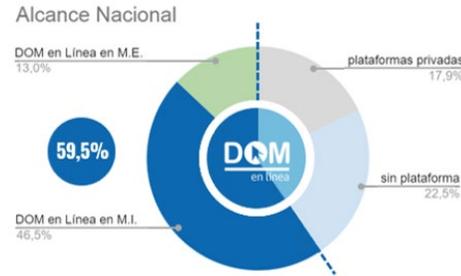

Avance de Implementación DOM en Línea

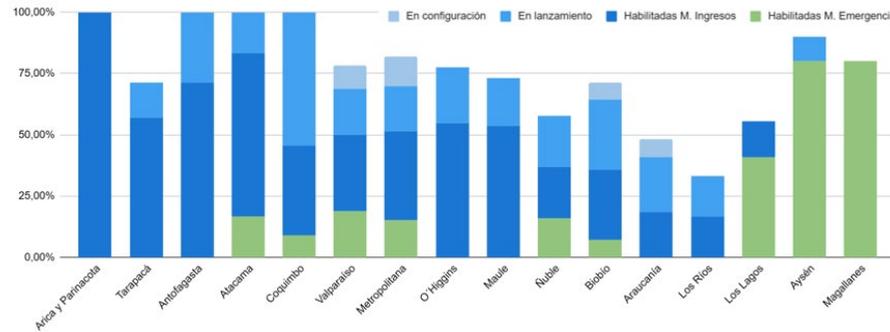


DOM en Línea – Avance de Implementación

Avance de Implementación

A noviembre del año 2022, **195 comunas** se encuentran trabajando con DOM en Línea, **141 comunas operativas** (96 Ingresos y 45 Emergencia) y **54 comunas en lanzamiento**. Considerando que el nuevo módulo “DOM Solicitud de Trámites”, se encuentra pronto a entrar en operación con 12 certificados e incorporará otros trámites superado su proceso de testeo y que los actuales módulos de Emergencia e Ingresos dejarán progresivamente de existir, cuando la migración de las comunas habilitadas en aquellos, sea completa hacia este nuevo módulo, el análisis incluye la categoría “en configuración dado que constituye una gestión transversal para su implementación”, considerando **11 comunas en configuración**. A su vez, aumenta la presencia **nacional** al **59,5%** y un espacio de crecimiento vinculado a 78 comunas que no cuentan con plataforma digital.

Por otra parte, de modo consecuente, se ha incrementado el uso la plataforma alcanzando un registro histórico al mes de noviembre 2022 de **45.521 solicitudes cursadas** en DOM en Línea, concentrándose en un 88% en el Módulo de Ingresos y destacando Los Ángeles como la comuna que ha cursado mayor número de solicitudes **8.912**. De igual modo, la solicitud de Certificados concentra el 69% del los trámites cursados, explicando la estrategia de iniciar la operación del módulo “DOM Solicitud de Tramites” con aquellos. Cabe subrayar la atención sistematizada de incidentes, que involucra a ambos equipos DDU Central y DINFO, favoreciendo un uso constante e intensivo de la plataforma digital.

DOM EN LÍNEA - REPORTE DE USO

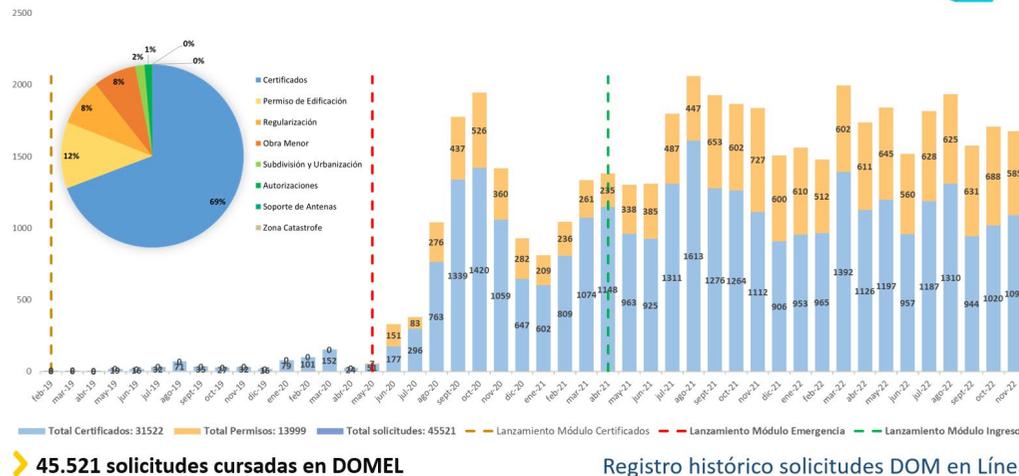

DOM en Línea – Reporte de Uso solicitudes a NOV 2022

Gestión Líneas de trabajo

El apoyo permanente del Equipo DOM en Línea a los municipios, en proceso de habilitación y que se encuentran operativos, considera cinco líneas de trabajo: Capacitación, Implementación, Convenio MINVU, Firma Electrónica y Pago en Línea. Dado que es condición solo el cumplimiento de las dos primeras para el lanzamiento al público y teniendo como contexto la Estrategia de Continuidad 2022, la gestión de la asesoría territorial contabiliza **90 capacitaciones** (34 con demo y 56 Inducción) con la asistencia de **892 asistentes** (509 y 293 respectivamente). De modo adicional, se realizan reuniones para resolver dudas de los equipos municipales y previo a entrar en operación, se acompaña un flujo de prueba con los roles asignados de aquellos.

LINEAS BASE LANZAMIENTO A PÚBLICO		LINEAS COMPLEMENTARIAS		
CAPACITACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	CONVENIO MINVU	FIRMA ELECTRÓNICA	PAGO EN LÍNEA
Reunión de inducción 4 al mes	Configuración DOM en línea 5 días	Revisión y aprobación de borrador 2 días	Convenio SEGPRES indefinido*	Contrato o convenio indefinido*
Capacitación con demo 3 por mes	Lanzamiento a público indefinido*	Firma alcalde y envío de copias físicas indefinido*	Configuración DOM en línea 2 días	Configuración SEM indefinido*
		Firma de Ministro y emisión de Resolución 6 meses	Configuración SEGPRES indefinido*	Configuración DOM en línea 1 día

Gestión, indicadores 2do sem 2022



Módulo de Ingresos, Líneas de trabajo

En la etapa de Implementación, la **Gestión de usuarios** vinculada a la recepción de la Planilla Domel y obtención de claves de acceso, asignadas a los usuarios que participarán con sus roles en el flujo de trabajo, considera dos requerimientos que permiten configurar la comuna en el sistema DOM en Línea:

- un primer requerimiento a Ayuda asociado al acceso por PSSIM por cada solicitud,
- un segundo requerimiento derivado a la DINFO, para los usuarios que operarán dentro del sistema DOM Revisión.


Posteriormente, en el proceso de acompañamiento a las DOM que se encuentran habilitadas al público, se acogen las necesidades de modificación de sus usuarios, ya sea para habilitar el acceso a usuarios nuevos, deshabilitar a usuarios que dejaron de pertenecer a la DOM, modificar roles asignados a usuarios antiguos o datos de contacto de estos.

Durante el segundo semestre, se habilitaron a los usuarios de **8 comunas** en el Módulo de Ingresos. A su vez, durante el seguimiento a las DOM, se han atendido un total de **61 requerimientos** asociados a **54 comunas**.

De acuerdo a los indicadores de gestión, los tiempos de respuesta a las DOM han ido disminuyendo, reduciendo el promedio de 20 días corridos en mayo, a 4 días corridos en el mes de noviembre. Con el propósito de favorecer una atención más oportuna a las Direcciones de Obras, la DINFO está elaborando un desarrollo asociado al “Administrador de Municipalidades”, que permitirá al Equipo DOM en Línea contar con mayor autonomía para configurar los usuarios dentro del sistema DOM Revisión.

Si bien es responsabilidad de los municipios completar las líneas de trabajo complementarias, en referencia a aquellas que involucran un apoyo institucional, cabe destacar la oportunidad de acompañamiento en la gestión de los municipios, que surge producto de la modificación del procedimiento en la configuración de **Firma Electrónica Avanzada SEGPRES** al incorporar un paso adicional para la obtención de propósito, impulsando la etapa final para la habilitación de los firmantes en el sistema DOM en Línea.

Por otra parte, respecto del proceso de migración a la plataforma SEM 2 de SUBDERE, se comunicó con anticipación esta mejora del sistema a los municipios que cuentan con **Botón de Pago TGR**, en su inicio y término, junto con abordar las consultas de aquellos relativas al ingreso de datos bancarios, contando para ello con el apoyo de la encargada de esa institución para resolver las dudas de sus usuarios.

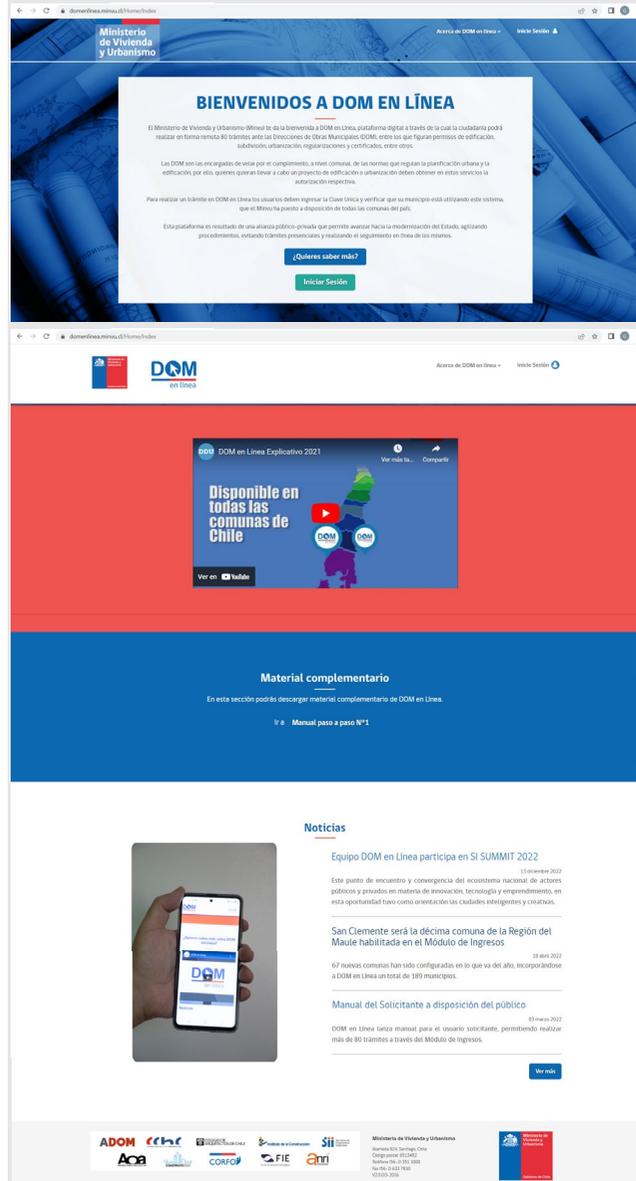

Sitio web DOM en Línea, situación actual

Comunicación –sitio web DOM en Línea

En virtud del crecimiento del Ecosistema DOM en Línea, atendiendo que el sitio web si bien acoge contenido del proyecto en sus distintas secciones, fundamentalmente es la puerta de entrada a la plataforma digital y empuja la necesidad de su reformulación. De hecho, actualmente opera con módulos de tramitación del usuario solicitante en constante evolución: Emergencia – Ingresos – DOM Solicitud de Trámites (DOM ST), donde los más simples no dejarán de existir hasta lograr el transito hacia los más completos. A su vez, el Módulo de Certificados, que tiene requisito la carga de bases catastrales actualizadas en su operación en 6 comunas, tenderá a ser reemplazado por la habilitación del DOM ST. De igual manera, la próxima puesta en marcha del “Portal de Seguimiento de Trámites” y la plataforma “Supervigilancia y Reclamos SEREMI”, que estarán vinculados a DOM en Línea junto al futuro Portal de Seguimiento de IPT, refuerzan la necesidad de modificación del sitio web.

Es por ello, que desde la DINFO se propondrá un ingresador común en <https://domenlinea.minvu.cl/> accediendo a una sección de encabezado del trámite que derive automáticamente al módulo operativo en la comuna que se solicita, previa autenticación vía Clave Única. Sin embargo, dada la rigidez de la estructura actual del sitio web, no permitirá la administración de contenido alojado en aquella. Por lo tanto para este último propósito, surge como solución factible y oportuna en una etapa inicial, la elaboración de un **Landing Page** vinculado al sitio web del MINVU que, junto con permitir el acceso al sistema DOM en Línea y las Plataformas de Acceso Ciudadano, informe y oriente a toda la ciudadanía respecto de los temas de interés de todas las DOM del país. Para ello, durante este proceso de reordenamiento, se ha contado con la asesoría y colaboración de profesionales de los Equipos de Comunicaciones MINVU y DDU. En una etapa futura se espera contar, para este efecto, con un sitio web que permita gestionar el contenido en páginas, ofrezca mayores funcionalidades y profundidades, etc



Santiago Innova, junto a la **Universidad Tecnológica Metropolitana, SÉ Santiago, el Centro de Revolución Tecnológica para las Industrias Creativas**, con el apoyo de **Corfo**, tienen el agrado de invitarte a participar del evento para :



Ven a conocer el programa, sus beneficios y la opción de participar en ISI Awards Stgo 2022, con premios de hasta **\$1.5 millones de pesos**
¡TE ESPERAMOS!



Eventos de difusión

Evento lanzamiento Programa **“Viraliza Formación para la expansión internacional: Startup Innova”** 19.10.2022

El evento, organizado por Santiago Innova con el apoyo de CORFO, se propone como un espacio de trabajo colaborativo, que busca potenciar y hacer expansible el talento del ecosistema que participará en el programa, el cual está orientado a ofrecer soluciones a necesidades actuales y futuras, que promuevan ciudades creativas, resilientes e inclusivas, permitiéndoles llegar a nuevos mercados internacionales o levantar capital extranjero.

Acogiendo esta invitación, la trayectoria de DOM en Línea se sitúa en un nuevo espacio de oportunidades, ofreciendo posibilidades de generar alianzas que fortalezcan el proyecto y contribuyan a su difusión, conectando con actores públicos y privados que ponen a disposición un plan, que incluye diagnósticos, formación, mentoría, vinculación y entrenamiento, contemplando en su co-ejecución a la UTEM, Sé Santiago Ciudad Inteligente y CRT+IC, con la colaboración de Broota y Dadneo.

En el panel de conversación, en torno a "Ciudades inteligentes y creativas: una mirada desde el emprendimiento al Chile 2050" se relevó, el emprendimiento como una de las fuerzas que tracciona la innovación, la promoción de conexiones improbables asociada a la creatividad, una propuesta de valor que se aprecia en el mercado tiene el potencial de convertirse desde lo local en global, por señalar algunas. El evento se realizó en Santiago, en el **Centro Hyundai del Movistar Arena**, en cuanto espacio creativo .

SI SUMMIT 2022 “Relevancia del ecosistema emprendedor en las Ciudades Inteligentes y creativas 4.0” **GAM** 29 y 30.11.2021

En su tercera versión, SI SUMMIT 2022 reunió a diversos actores públicos y privados vinculados con la innovación, la tecnología y el emprendimiento, en un evento realizado en el GAM, en Santiago y en Casa W, en Concepción, además fue transmitido vía streaming a nivel nacional. Llevó por título **“Relevancia del ecosistema emprendedor en las Ciudades Inteligentes y Creativas 4.0”** y como objetivo se propuso impulsar y promover soluciones tecnológicas innovadoras, inclusivas y sustentables, en el desarrollo de las ciudades del país.

El Equipo DOM en Línea participó en la primera jornada del evento, el cual se configuró en el punto de encuentro y convergencia del ecosistema nacional en las materias convocadas y durante los tres días del encuentro se llevaron a cabo charlas, paneles de conversación, pitch, reverse pitch, mentoría, entrevistas y el ISI Award 2022 en ambas localidades. Participaron empresas e instituciones que trabajan en el área de la innovación, entre ellas, SONDA, CORFO y la Cámara de Comercio de Santiago con la plataforma “Innovación made in Chile”.

El evento SI SUMMIT 2022 fue organizado por Santiago Innova (SI), corporación privada sin fines de lucro que trabaja con emprendedores, micro, pequeños, medianos y Start-up que, en esta oportunidad, destinó un día del evento a la industria de la música e hizo el lanzamiento de “Mercado Creativo Santiago Innova”, primera plataforma de incubación de proyectos creativos.
